IPD-AI · MEETING 1

闭环任务盘点

按闭环时间着色 本次闭环 10.27 10.29

10.21 临时 IPD 开发流程智能化工作规划汇报 @1931

10.29 — **Auto Development 规划和架构设计**
以 Claude Code 为标杆，选一个纯净软件项目（云端 / 平台类）做试点，输出规划并跑通端到端流程
@周志明 Felix

本次闭环 — **组建高精尖小分队**
人员须懂 Software Engineering 和大模型，不要什么事都一个人干，跨部门找最有能力的人，HR 配合拉资源
@周志明 Felix @孙心怡

10.23 临时会 数智化相关事项思考 @1931

本次闭环 — **Auto D / Auto R 智能化汇报机制**
每两天汇报，10/25 下午首次汇报
@周志明 Felix


10.27 — **各产品线编程现状摸底**
纯软件与嵌入式分别在用什么平台和工具、token 消耗、所遇问题，形成系统性汇报
@周志明 Felix @各产品线

10.27 — **Auto D 试点项目**
与王鹏、刘倍源对齐并选定 Auto D 试点项目，从刘倍源负责的平台类产品中确定试点对象
@周志明 Felix @王鹏 @Bryan

IPD-AI · MEETING 1 · 节奏

研发数智化汇报沙盘

固定周期：**每周逢双汇报（周二 2 · 周四 4 · 周六 6）**，定期与董事长 / CEO 对齐进展

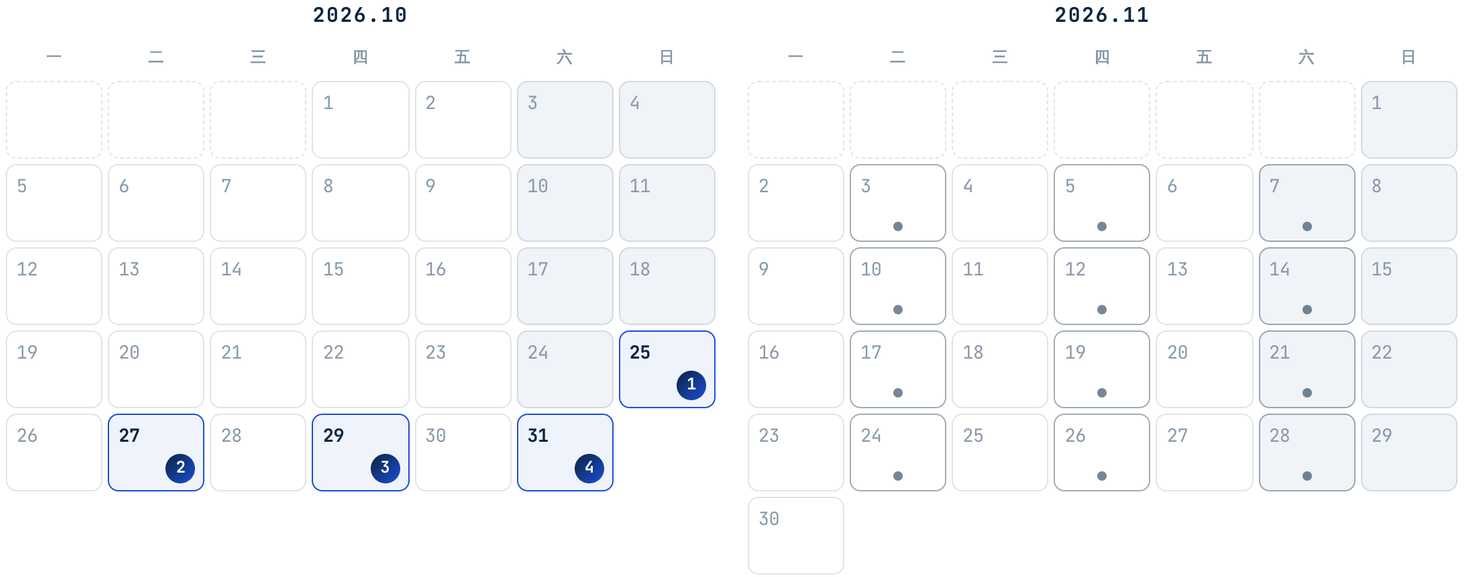

● 固定汇报节奏

每周逢双（周二 2 · 周四 4 · 周六 6）汇报，定期与董事长 / CEO 对齐进展；**10.25 为首次汇报**

1	**10.25** 周日	**研发数智化汇报沙盘** · 闭环任务：小组人员构成
2	**10.27** 周二	**AS-IS 调查**：研发现状情况调研及效率分析
3	**10.29** 周四	**Anthropic Engineering Mehtod：Human-AI Collabloration Architectury 的洞察分析**：进行开发流水线架构对标，回答完成研发数智化，我们需要做哪些工作
4	**10.31** 周六	**更新研发数智化整体落地计划**：明确内容：SOW 具体时间、交付特性、验证标准

落地计划概要

阶段一**纯软件**先行，验证后推广至阶段二**嵌入式**，最终覆盖阶段三各职能域的**数字员工**

阶段	领域	环节	工作内容	时间
阶段一	**研发 IPD 领域** 纯软件	**概念**	领导与 IPD 小组对智能化的概念 / 目标对齐	✓已结束
		计划	完成 AutoD 概要设计、系统设计。充分参考/复制 Claude Code 的架构，最大可能保持一致 • 本周四汇报对 Anthropic Engineering Mehtod：Human-AI Collabloration Architectury 的洞察分析 • 计划 11.1 - 11.7 期间，设计在 IPD 小组内，以及跨部门与王鹏、杨伟明等充分讨论 • 计划 11.7 - 11.15 系统设计定稿输出，明确精确的 SOW 清单	进行中 2周，至11.15
		实现	以自研的方式实现 AutoD 流水线	2月，至1.15
		验证	试验局项目验证	1月，至2.15
		发布	面向公司各事业部/产品线线推广，启动阶段二	—
阶段二	**研发 IPD 领域** 嵌入式开发	待阶段一验证后展开		
阶段三	**采供制、营销副、财经、人资、行政办公** 数字员工	待阶段一验证后展开		

IPD 智能化小组



- 跨部门的虚拟组织，装载在 IPD 办公室中运作。
- 本身采用 AD 模式自举开发，不安排传统的研发人员（如开发、测试人员等）参与，这些工作由 Agent 完成。
- **问题**：董事长在 10.21 会上所说的“不要什么事情都一个人干，跨部门找最有能力的人”点出了当前风险所在。团队完整性与进度要求不匹配，社招专家入职需要时间，跨部门团队组建请求领导协助。
